



工事事務所 事故対策通信

～通信線を切断する事故が発生しました～

Vol. 46

令和6年4月発行

袋井土木発注工事 事故発生件数 令和5年度	事故項目	工事関係者負傷者	第三者(物損)	第三者(負傷)	工事事務所 合計	令和6年3月現在
	件数	1件	4件	0件	5件	

堤防伐竹作業中のバックホウを移動する際にアームを上げたまま走行し、**上空の通信線に気づかず接触し切断した**
(通信線切断により企業1件がネットワーク障害の被害を受けた)


【事故の原因】

- ・ 施工計画書に架空線の存在は記載されていたものの、**現場に架空線の明示がなかった**
- ・ 伐採作業時、架空線付近に**監視員を配置していなかった**



【事故の対策】

- ・ 看板やカラーコーンを設置し、架空線にはリボンをつけて、現場に架空線の位置を明示する
- ・ 架空線付近で作業する場合は、監視員を設ける

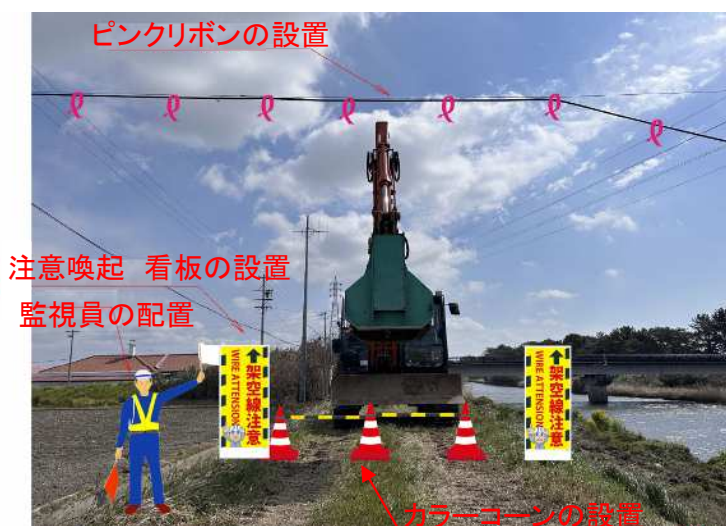

架空線周辺の作業時には、架空線を明示監視員を配置し、事故を未然に防ぎましょう！



問合せ先
袋井土木事務所 企画検査課
TEL : 0538-42-3216
Mail : fukudo-
kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp

袋井土木事務所

